PLUGGED JUNE 3, 2022

SHOSHONE 65-42

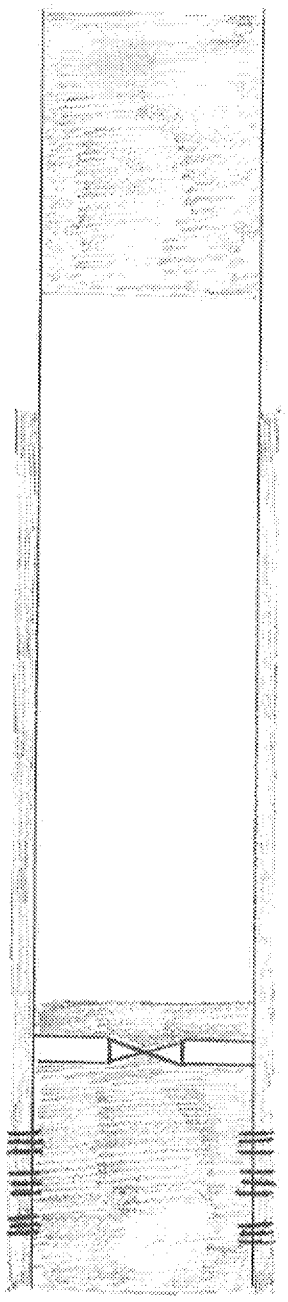

CMT 3'-219' inside 5-1/2"

TOC 362' (calc)

9 ppg mud 300-650'

CIRC @ 804' (6 sx on top, 35 sx below)

EMPTY PERFS 854-1,114'

5-1/2", 14#, J-55 @ 1,149'

7-7/8" Hole
