MW-2

Date	TCE	PCE	1,1,1-TCA
June-95	**23**	**42**	**510**
April-02	**8.2**	**57**	59
June-03	**9.5**	**39**	88
December-03	**9.9**	**65**	99
June-04	2.5	**19**	20
January-05	1.4	**15**	7.7
June-05	0	**10**	3.3
December-05	3.05	**22.3**	21.8
June-06	0	**39**	**605**
December-06	1.8	**29**	8.8
June-07	0	**7.9**	3.9
December-07	1.5	**5.3**	0
March-08	0	2.1	0
October-08	0	3.4	0
March-09	0	0	0
June-09	0	0	0
December-09	0	0	0
June-10	0	0	0
December-10	0	1.3	0
11-Jun	0	0	0
December-11	0	1.7	0
June-12	0	1.3	0
December-12	0.5	2	0
June-13	0	1.1	0
Dec-13	0	0.9	0
Jun-14	0.25	1.1	0.62
Oct-14	0	0.55	0
Jun-15	0	1.5	1.2
Dec-15	0.52	1.8	0
Jun-16	0	1.1	0
MCLs	5	5	200

Concentrations reported in micrograms per liter.
Bold values exceed the MCL.
EPA Method 8240 was run. Only chemicals with detections above the MCLs were plotted.
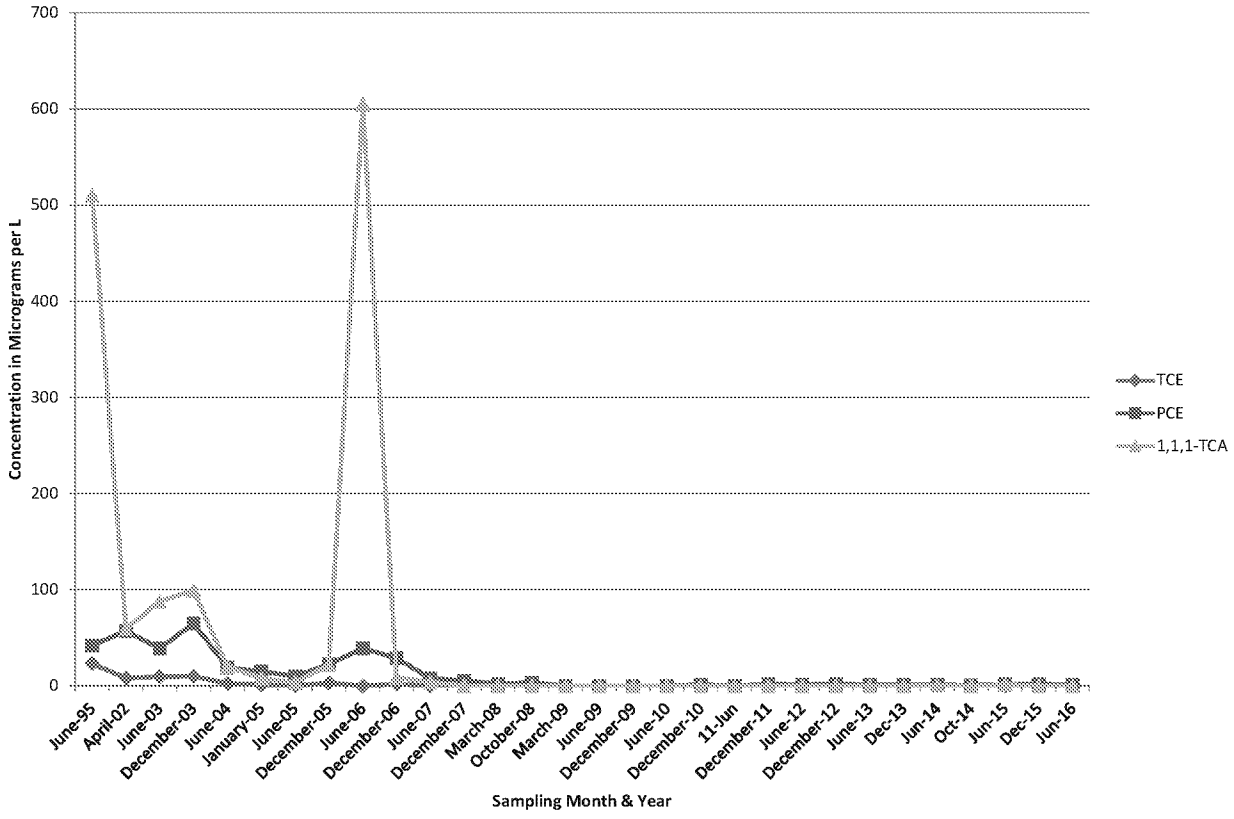
Figure 2
Trends in VOC Concentrations at the Central Wire Union, Illinois Plant for Parameters Exceeding the MCLs in Monitoring Well MW-2, 1995 - June 2016
