enero 12, 2021
January 12, 2021

SILT FENCE INSTALLATION

SUEÑO DE AURORA

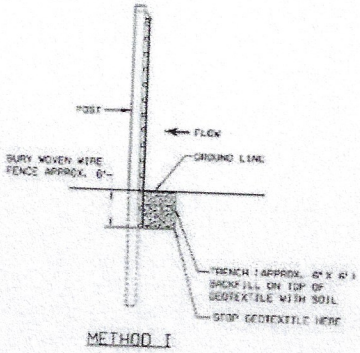

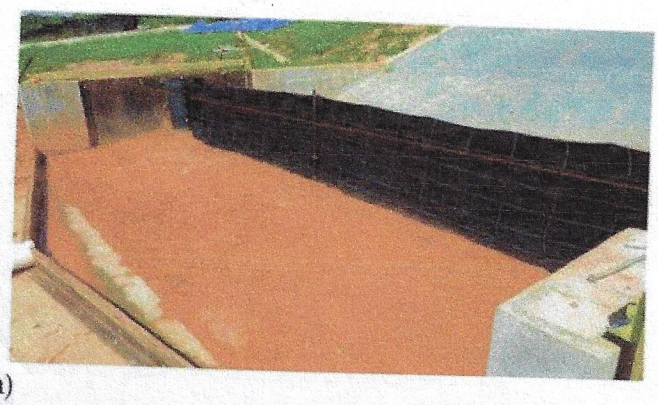

(a)



(b)

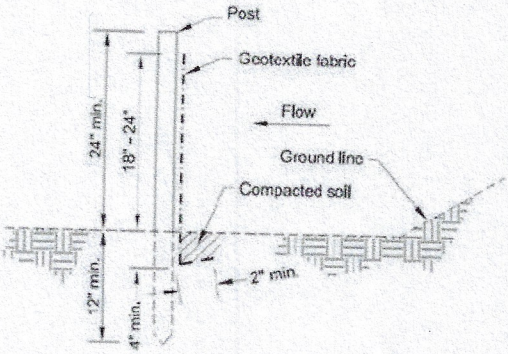

(c)

enero 12, 2021

SILT FENCE INSTALLATION

1-ESTACAS AN CONTRA DE LA CORRIENTE

2-FALDA DE FILTER FABRIC ENTERRADA 6 INCHES

3-SILT FENCE SE INSTALA EN PUNTOS BAJOS DONDE SE RECOLECTA EL SEDIMENTO.

4-SE DEBE INSPECCIONAR SEMANALMENTE O DESPUES DE UN EVENTO DE LLUVIA.

5-SI EL SEDIMENTO LLEGARA A TRASPASAR EL FILTRO O FALLARA EL DISPOSITIVO SE BEBE RECOLECTAR EL SEDIMENTO Y VOLVER A INSTALAR EL SILT FENCE CORRECTAMENTE.

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	FECHA	POSICION
1-	AXEl Iuhring	12/1/21	Supervisor [signature]
2-	Maichel Feliciano	12/1/21	Labor [signature]
3-	Fernado I Cruz	12/1/21	carpintero Fernado I
4-	Carlos Resto	12/1/21	operador
5-	Felipe Rodrigues	12/1/21	[signature]
6-	Carlos Iuhring	12/1/21	[signature]
7-			
8-			
9-			
10-			
